

Tự viết hệ điều hành thời gian thực cho STM32F469NI

Đề tài: **Phát triển phần mềm nhúng có ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI)** · Vũ Trí Công ·
GVHD: TS. Nguyễn Trung Hiếu · Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Báo cáo một phiên làm việc thật ngày **30/09/2026**, trong đó tác tử EIDE v3 phân tích, thiết kế và hiện thực một nhân RTOS mới thay hoàn toàn FreeRTOS trên bo STM32F469I-DISCO.

1. Yêu cầu

1.1. Yêu cầu chức năng

Mã	Yêu cầu	Nghiệm thu bằng
YC-01	Bỏ hoàn toàn FreeRTOS khỏi firmware	Không ký hiệu xTask*/vTask*/xQueue* nào trong tệp ảnh
YC-02	Nhân tự viết chạy đa nhiệm tiên định trên Cortex-M4F	LED nhấp nháy ở hai chu kỳ khác nhau trên bo thật
YC-03	Giữ nguyên sáu tác vụ của bản cũ	Đếm rtos_task_create trong main.c
YC-04	Truyền tin giữa tác vụ có chờ và có hết hạn	Nút vật lý PA0 đổi trang qua hàng đợi
YC-05	Màn hình LCD 800×480 hiện đúng giao diện cũ	Đọc ngược bộ nhớ khung hình từ SDRAM của chip
YC-06	Cảm ứng điện dung đổi trang khi chạm	Người dùng chạm thật lên bo

1.2. Ràng buộc

- Chip **STM32F469NIH6**, lõi Cortex-M4F, Flash 2 MB, SRAM 324 KB, SDRAM ngoài 16 MB.
- Máy phát triển **không có newlib** cho ARM ⇒ liên kết ở chế độ -nostdlib; mọi hàm chuẩn phải tự viết hoặc tránh dùng.
- Được phép **tham khảo driver** đã có (LCD/DSI/SDRAM/cảm ứng) của bản FreeRTOS.
- Nạp qua **ST-LINK kiểu ổ đĩa**; cổng ảo /dev/cu.usbmodem1103 **không nối USART** nào, nên không dùng printf để gỡ lỗi.


1.3. Phạm vi bề mặt phải thay

Bản FreeRTOS chỉ dùng **9 lời gọi**. Đó là toàn bộ hợp đồng phải dựng lại:

FreeRTOS	Thay bằng
xTaskCreate	rtos_task_create
vTaskStartScheduler	rtos_start
vTaskDelay · pdMS_TO_TICKS	rtos_delay_ms
xTaskGetTickCount	rtos_get_tick_count
xQueueCreate · xQueueSend · xQueueReceive	rtos_queue_init · rtos_queue_send · rtos_queue_receive
portMAX_DELAY	RTOS_WAIT_FOREVER


2. Thiết kế theo mô hình C4

2.1. Mức 1 — Bối cảnh hệ thống

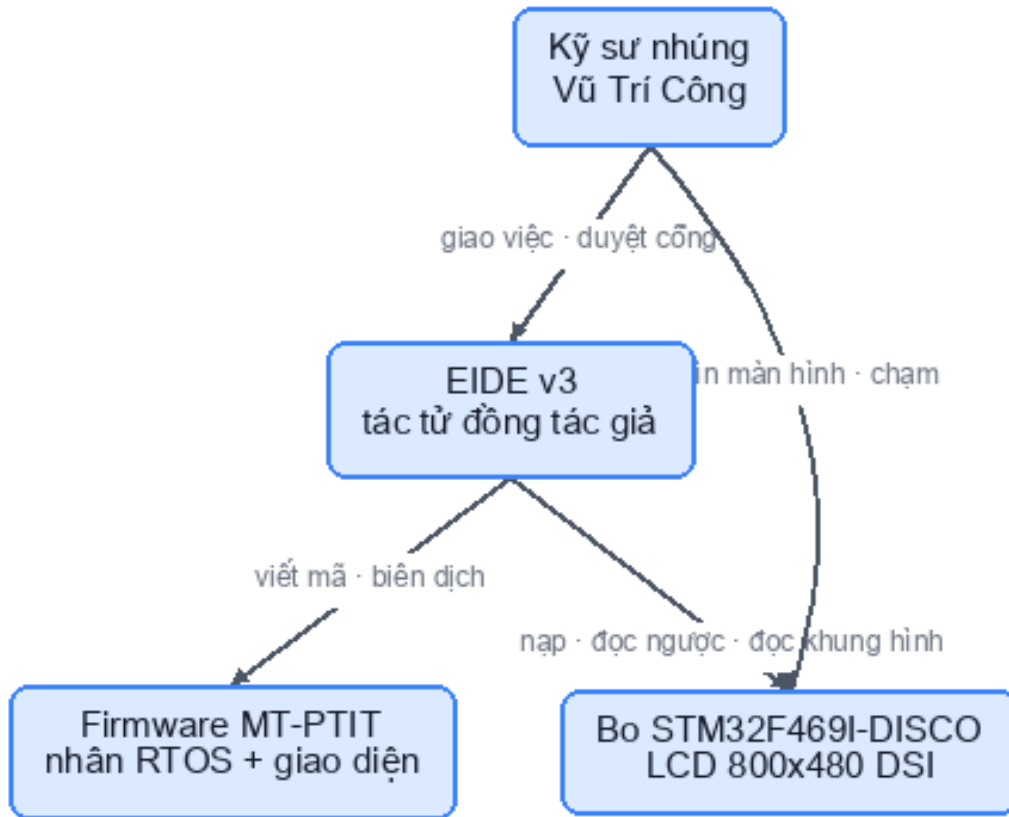

Sơ đồ khối · 4 khối · 4 nối

2.2. Mức 2 — Thành phần trong tệp ảnh

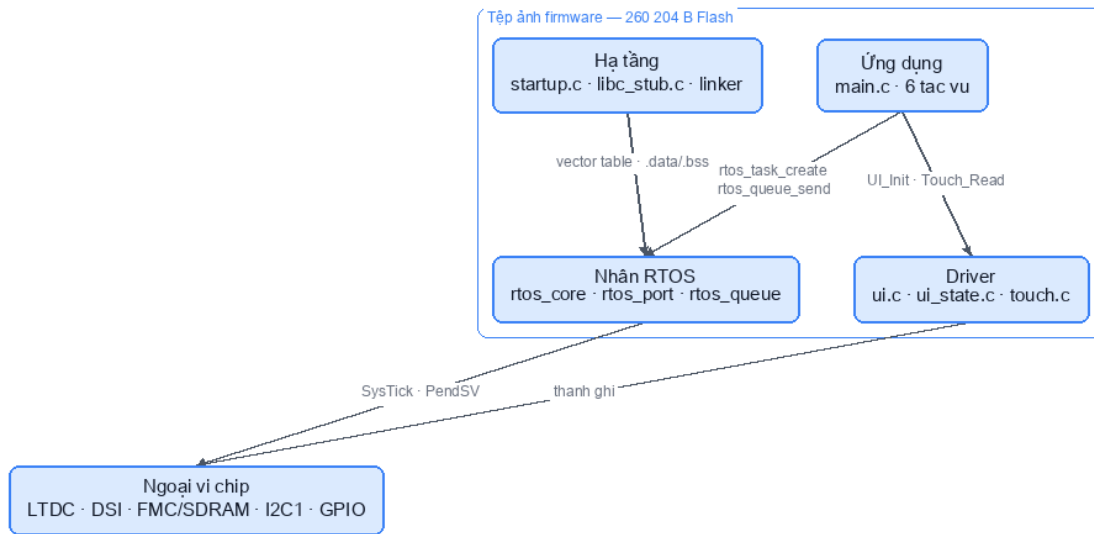

Sơ đồ khối · 5 khối · 5 nối

2.3. Mức 3 — Bên trong nhân RTOS

Nhân RTOS — 689 dòng

rtos_queue.c — 122 dòng
vòng đếm tính
gửi/nhận có hết hạn

chặn/đánh thức tác vụ

rtos_core.c — 223 dòng
bảng TCB · hàng chờ theo ưu tiên
danh sách trễ · tác vụ Idle

rtos_port_trigger_pendsv

rtos_core_switch_context
rtos_core_tick_handler


rtos_port.c — 166 dòng
khởi tạo khung stack
PendSV_Handler · SysTick_Handler

//

Sơ đồ khối · 4 khối · 6 nối

Tham số nhân: **32 mức ưu tiên** (0 cao nhất, 31 cho Idle) · tối đa **16 tác vụ** · stack mặc định **256 từ** (1 KB), Idle **128 từ**.

2.4. Mức 4 — Trình tự chuyển ngữ cảnh

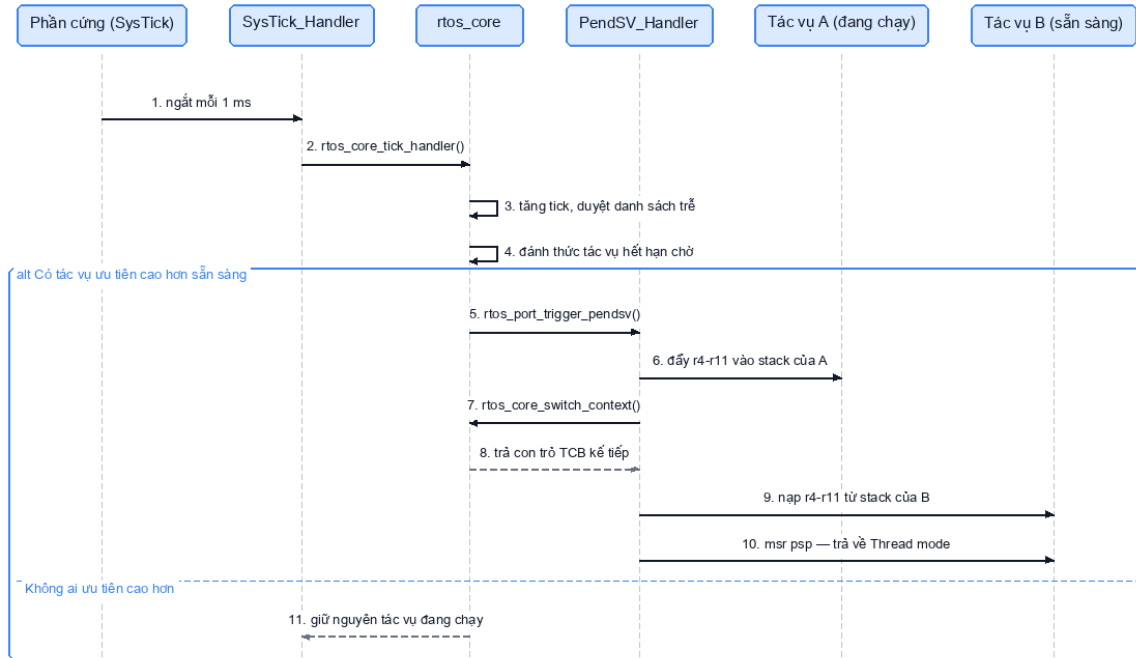

Sơ đồ tuần tự · 6 vai · 11 bước

Phần cứng tự lưu r0–r3, r12, LR, PC, xPSR; PendSV_Handler viết bằng **assembly naked** chỉ phải lo r4–r11 và con trỏ psp. PendSV đặt ở mức ưu tiên ngắt thấp nhất để nó không bao giờ chen vào giữa một ngắt khác.

3. Quá trình tác tử thực hiện

3.1. Sáu chặng, mỗi chặng một cổng duyệt

Chặng	Tác tử làm gì	Cổng	Hiện vật để lại
1. Phân tích	đọc mã tham khảo, chỉ ra 9 API phải thay	—	bản phân tích trong hội thoại
2. Kiến trúc	ba phương án, so bằng tiêu chí đo được	—	3 hiện vật option
3. Chốt hướng	chọn PA-A (tiền định, PendSV)	G-DESIGN	ADR
4. Kế hoạch	6 bước, mỗi bước một tệp	G-SCOPE	plan:current
5. Thực thi	viết nhân, biên dịch, sửa	G-FILE	4 tệp nhân + main.c
6. Nạp và kiểm	nạp, đọc ngược, đọc khung hình	G-FLASH	mach.bin, ảnh khung hình

Ba phương án ở chặng 2 được tác tử **tự dán nhãn tầng ĐỒNG**, vì các con số RAM/độ trễ là ước lượng từ tập lệnh chứ chưa đo trên phần cứng. Đó là kỷ luật N1 của hệ thống: con số nào chưa đo thì không được đứng cùng hàng với con số đã đo.

3.2. Ba lỗi bắt được, và cách bắt được

Không lỗi nào tìm ra bằng đọc mã. Cả ba đều bắt đầu từ **một quan sát trên bo thật**.

Triệu chứng	Tác tử đo được	Nguyên nhân gốc
Ánh chỉ 1 416 byte	0 ký hiệu LCD/UI/Touch trong ELF	tác tử thu hẹp đầu vào biên dịch cho tới khi qua được
LED chạy, LCD đen	khung hình có đủ 6 màu $\Rightarrow$ phần vẽ đúng; DSI_WISR bit PLLLS = 0, DSI_PCTLR = 0, DSI_ISR1 = 0x80	HAL_Delay() nối vào rtos_delay_ms() nên nhường CPU giữa chuỗi khởi tạo DSI có ràng buộc thời gian cứng
Cảm ứng không ăn	GPIOB xác nhận Touch_Init() đã chạy	i2c_delay() dùng vòng NOP cố định; xung nhịp lên 180 MHz làm I2C vượt 600 kHz

Lỗi DSI đáng ghi nhớ nhất: **nó chỉ tồn tại vì có RTOS**. Bản FreeRTOS không gặp vì HAL_Delay ở đó là vòng chờ bận. Một nhân đúng về lập lịch vẫn có thể phá một khối ngoại vi chỉ vì nó nhường CPU đúng chỗ không được nhường.

3.3. Khối lượng công việc đo được

Chỉ số	Giá trị
Lượt trao đổi người $\leftrightarrow$ tác tử	46 — trong đó 21 lần anh gõ , 9 lần quyết cổng duyệt, 15 lần xem, 1 lần chọn phương án
Lời gọi công cụ	367 (31 loại khác nhau)
Công cụ dùng nhiều nhất	fs.read $\times$ 102 · fs.glob $\times$ 43 · fs.grep $\times$ 40 · ledger.query $\times$ 32
Changeset (thay đổi hoàn tác được)	20
Hiện vật trong kho	18
Sự kiện số cái	3 915 — trong đó 311 lời gọi mô hình ở vòng chính
Lời gọi mô hình ghi được nguyên văn	351 = 307 vòng chính + 44 của tác tử con
Mã tác tử viết ra	1 029 dòng = nhân 689 + ứng dụng main.c 340
Mã dùng lại không sửa	757 dòng driver (ui.c · touch.c · startup.c · libc_stub.c)
Flash chiếm	260 204 B (bản FreeRTOS: 263 740 B — ít hơn 3 536 B)
RAM tĩnh (.bss)	13 596 B (bản FreeRTOS: 36 424 B — ít hơn 22 828 B)

4. Thời gian và chi phí

4.1. Thời gian

Hạng mục	Giá trị
Bắt đầu → kết thúc (thời gian thực)	08:59:33 – 10:20:44 UTC = 81,2 phút
Thời gian chờ mô hình	24,8 phút (30,5 % thời gian thực)
Thời gian còn lại	56,4 phút — biên dịch, nạp, đọc ngược bo, và người đọc kết quả
Số lời gọi mô hình	355
Trung bình mỗi lời gọi	4,2 giây
Trung bình mỗi lượt trao đổi	1,8 phút

4.2. Token đã dùng

Loại	Token	Ghi chú
Vào — tổng	23 126 605	
Vào — đã đệm	19 793 272	85,6 % , tính giá rẻ hơn nhiều
Vào — tính giá đầy đủ	3 333 333	phần thật sự mới mỗi lượt
Ra	73 517	
Suy nghĩ	118 429	

Tỉ lệ đệm 85,6 % là con số đáng chú ý nhất ở đây: hiển pháp, lược đồ 122 công cụ và phần đầu hội thoại lặp lại ở mọi lượt, nên chúng được đệm. **Chi phí thật gần như chỉ phụ thuộc phần mới của mỗi lượt.**

4.3. Chi phí

Kho không lưu bảng giá, nên chi phí trình bày dưới dạng **công thức kèm tham số** — anh thay đơn giá thật trong hoá đơn vào để có con số cuối.

Chi phí = $3,333 \times G_{\text{vào}} + 19,793 \times G_{\text{đệm}} + 0,192 \times G_{\text{ra}}$ (đơn vị: triệu token; G_{ra} áp cho cả token ra và token suy nghĩ)

Kịch bản đơn giá (USD / triệu token)	Vào	Đệm	Ra	Chi phí phiên
A — mức thấp	0,075	0,019	0,30	≈ 0,69 USD
B — mức giữa	0,15	0,0375	0,60	≈ 1,36 USD
C — mức cao	0,30	0,075	2,50	≈ 2,96 USD

Quy đổi theo kịch bản B: **≈ 34 000 đồng** cho toàn bộ phiên — gồm phân tích, ba phương án kiến trúc, 1 029 dòng mã, sáu lần biên dịch, bốn lần nạp bo, và ba lần dò lỗi phần cứng tới tận thanh ghi DSI.

5. Ước lượng nếu làm bằng nhân sự

Phần này trả lời câu: *cùng khối lượng ấy, một công ty chỉ dùng người thì tốn bao nhiêu?*

Toàn bộ mục 5 là ƯỚC LƯỢNG — tầng ĐỒNG. Mục 1–4 là số đo đọc từ sổ cái và nhật ký; mục này là phán đoán từ phạm vi đã biết. Hai loại số ấy **không đứng cùng một hàng**, nên chúng ở hai mục khác nhau chứ không trộn vào một bảng.

5.1. Phương pháp

Dùng **WBS ba điểm (PERT)**: mỗi hạng mục ước ba giá trị — lạc quan (LQ), khả dĩ (KD), bi quan (BQ) — rồi lấy $E = (LQ + 4 \times KD + BQ) / 6$. Cách này nói ra được **độ bất định**, thứ mà một con số đơn lẻ giấu đi.

Giả định nền:

- Đội đã quen STM32 và chuỗi công cụ ARM, **chưa từng viết nhân RTOS**.
- **Driver LCD/DSI/SDRAM/cảm ứng đã có sẵn**, không tính vào khối lượng phát triển — giống hết điều kiện của phiên tác tử.
- 21 ngày công một tháng, 8 giờ một ngày.
- Đã có bo, có máy nạp, không tính chi phí thiết bị.

5.2. Bảng phân rã công việc

Hạng mục	Vai trò	LQ	KD	BQ	PERT
Phân tích hiện trạng: đọc ứng dụng FreeRTOS + driver, chốt bề mặt 9 API	Senior	1	2	4	2,2
Nghiên cứu chuyển ngữ cảnh Cortex-M4F (PendSV, PSP/MSP, khung stack)	Senior	1	3	6	3,2
Thiết kế kiến trúc: so ba phương án, chốt, viết ADR	Senior	1	2	3	2,0
Thiết kế chi tiết: TCB, hàng chờ ưu tiên, danh sách trễ, hàng đợi	Senior	1	2	3	2,0
Hiện thực tầng port (assembly naked, khởi tạo khung stack)	Senior	2	4	8	4,3
Hiện thực lõi lập lịch + tác vụ Idle	Mid	2	3	6	3,3
Hiện thực hàng đợi IPC có hết hạn	Mid	1	2	4	2,2
Tích hợp 6 tác vụ ứng dụng + driver sẵn có	Mid	1	2	4	2,2
Dựng hệ thống build: -nostdlib, linker script, cờ FPU	Mid	0,5	1	3	1,2
Gỡ lỗi DSI: PLL không khoá do nhường CPU giữa chuỗi khởi tạo	Senior	1	3	8	3,5
Gỡ lỗi I2C cảm ứng: định thời vòng NOP sau khi đối xung nhịp	Senior	0,5	1	3	1,2
Kiểm thử trên bo: 6 tác vụ, cảm ứng, hồi quy	QA	1	2	4	2,2
Viết tài liệu: yêu cầu, thiết kế C4, báo cáo	Mid	1	2	4	2,2
TỔNG		14	29	60	31,7 ngày công

Hai hạng mục **bi quan gấp bốn lần lạc quan** — *tầng port assembly* (2 → 8) và *gỡ lỗi DSI* (1 → 8). Đó là hai chỗ rủi ro thật, và cả hai đều đã xảy ra đúng như vậy trong phiên tác tử: lỗi DSI là lỗi khó nhất, phải đọc tới thanh ghi DSI_WISR mới ra.

5.3. Khoảng tin cậy

Độ lệch chuẩn PERT: **±2,3 ngày**.

Mức tin	Khoảng
~68 %	29 – 34 ngày công
~95 %	27 – 36 ngày công

Nói cách khác: **32 ngày công ± 5**. Một con số tròn "một tháng rưỡi" không sai, nhưng nó không cho biết đâu là chỗ có thể trượt.

5.4. Nguồn lực và thời gian lịch

Vai trò	Ngày công	Tỉ trọng
Kỹ sư nhúng Senior	18,4	58 %
Kỹ sư nhúng Mid	11,1	35 %
QA nhúng	2,2	7 %
Quản lý dự án (20 % thời lượng)	6,3	—

Đội tối thiểu: **1 Senior + 1 Mid + QA bán thời gian + PM 20 %**.

Thời gian lịch ≈ 4 – 5 tuần. Senior là **đường găng**: 18,4 ngày công của anh ta gần như không song song hoá được — phân tích, thiết kế, tầng assembly và hai lần gỡ lỗi phần cứng đều nối tiếp nhau. Thêm người thứ ba **không rút ngắn được** phần này.

5.5. Chi phí nhân sự

Đơn giá theo lương tháng thị trường Việt Nam (triệu đồng), nhân **hệ số gánh 1,4** cho bảo hiểm, chỗ ngồi, thiết bị và chi phí quản lý:

Vai trò	Thấp	Giữa	Cao
Senior nhúng	40	55	70
Mid nhúng	20	27	35
QA nhúng	15	20	25

Kịch bản	Chi phí phát triển	Kèm PM	Quy đổi
Thấp	66,1 triệu	≈ 82 triệu	≈ 3 300 USD
Giữa	90,4 triệu	≈ 111 triệu	≈ 4 450 USD
Cao	115,4 triệu	≈ 142 triệu	≈ 5 700 USD

5.6. Đối chiếu bằng COCOMO — và vì sao nó lệch

Kiểm chéo bằng COCOMO cơ bản trên **1,029 KSLOC**:

Chế độ	Người-tháng	Ngày công	Tháng lịch
Organic	2,47	51,9	3,5
Embedded	3,73	78,2	3,8

COCOMO cho **52 – 78 ngày công**, gấp 1,6 – 2,5 lần ước lượng WBS (31,7). Chênh lệch ấy có lý do, và nói ra thì có ích hơn là chọn con số mình thích:

- COCOMO tính **trọn vòng đời công nghiệp**: đặc tả chính thức, rà soát chéo, kiểm thử hệ thống, tài liệu bàn giao, bảo trì ban đầu. Ở đây phần lớn những thứ ấy không có trong phạm vi.
- Nó được hiệu chuẩn trên **dự án lớn**, và được biết là **ước lượng thừa cho dự án rất nhỏ** — dưới 2 KSLOC thì hệ số cố định lấn át.
- Phạm vi này **dùng lại driver có sẵn**; COCOMO tính theo dòng mã giao ra mà không trừ phần tái sử dụng.

Nên lấy WBS làm số chính, và đọc COCOMO như **cận trên**: nếu đội chưa từng chạm Cortex-M ở mức thanh ghi, con số thật sẽ trôi về phía 50 ngày hơn là 32.

5.7. Đối chiếu với phiên tác tử

	Làm bằng nhân sự (ước lượng)	Phiên tác tử (đo được)
Thời gian lịch	4 – 5 tuần	81,2 phút
Công sức	31,7 ngày công (± 5)	46 lượt trao đổi của một người
Chi phí	≈ 111 triệu đồng (mức giữa, kèm PM)	$\approx 34\,000$ đồng tiền mô hình
Đội hình	1 Senior + 1 Mid + QA + PM	1 người + tác tử

Ba điều cần nói thẳng để bảng trên không bị đọc quá tay:

1. **Chưa phải cùng một sản phẩm.** Nhân RTOS trong phiên này chạy đúng trên bo, nhưng chưa qua thử nghiệm dài hạn, chưa đo độ trễ chuyển tác vụ bằng máy, chưa có bộ kiểm tự động chạy trên phần cứng. Một đội người ở mức 31,7 ngày công thường giao kèm những thứ đó.
2. **Người vẫn nằm trên đường găng.** 46 lượt trao đổi, và ba lỗi phần cứng đều bắt đầu từ việc **một người nhìn vào bo** rồi mô tả triệu chứng. Bỏ người ra thì phiên này không kết thúc được.
3. **Chi phí mô hình không phải toàn bộ chi phí.** Chưa tính công của người ngồi cùng (81 phút), giấy phép công cụ, và thời gian dựng môi trường.

Cách đọc đúng bảng này: tác tử **không thay thế** 31,7 ngày công, nó **nén** phần lớn trong số đó xuống còn thời gian một người đọc và quyết.

6. Kết luận

Ba điều phiên này chứng minh được, mỗi điều có bằng chứng kèm theo:

4. **Tác tử gánh được khối lượng phức tạp.** 689 dòng nhân RTOS có chuyển ngữ cảnh assembly, chạy thật trên chip, giao diện lên đúng như bản cũ.
5. **Quy trình có cổng chặn được việc làm ẩu.** Kế hoạch viết mã mới bị chặn cho tới khi có bước chọn kiến trúc; lệnh ghi đè một tệp chưa đọc bị từ chối.
6. **Chỗ hỏng thật nằm ngoài tầm đọc mã.** Cả ba lỗi đều cần đọc thanh ghi trên chip đang chạy — và đó đúng là việc mà một tác tử có công cụ phần cứng làm được, còn một trợ lý chỉ sinh mã thì không.

Điều phiên này **chưa** chứng minh: nhân RTOS mới chưa qua thử nghiệm dài hạn, chưa đo độ trễ chuyển tác vụ bằng máy đo, và chưa có bộ kiểm tự động chạy trên phần cứng.
